附 件

仙桃陈场渔光互补光伏电站一期100MW项目“1·3”一般起重伤害事故调查报告

2023年1月3日上午10时30分左右，仙桃陈场渔光互补光伏电站一期100MW项目施工工地发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡（死者唐良兵，男，58岁，仙桃市陈场镇徐梁岭村人）。直接经济损失约105万余元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）和《市（州）、县（区）生产安全事故调查处理工作指南》（鄂应急发〔2022〕7号）等法律法规和文件规定，2023年1月10日，经市人民政府批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市总工会、市发改委等部门人员组成的仙桃陈场渔光互补光伏电站一期100MW项目“1·3”一般起重伤害事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了事故企业存在的问题，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及

暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）相关单位及人员情况

1.项目建设单位：华润新能源（仙桃）有限公司（以下简称华润新能源）。成立日期：2021年9月29日；营业期限：2021年09月29日 至 2046年09月28日，统一社会信用代码：91429004MA4F38TP5E；公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)；住所：仙桃市东城大道99号；法定代表人：王剑；注册资本：肆亿陆仟贰佰万元人民币整；经营范围：一般项目：太阳能发电、风力发电；太阳能、风力发电技术服务；新兴能源的工程建设和技术研发；太阳能发电站和风电扬的开发、建设、运营技术服务和系统研发；综合能源管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.项目总包单位：中国电建集团重庆工程有限公司（以下简称重庆电建）。成立日期：1984年01月06日；营业期限：1984年01月06日至永久，统一社会信用代码：9150010820280l156A；公司类型：有限责任公司(法人独资)；住所：重庆市南岸区南坪金子村101号；法定代表人：柯胜金；注册资本：柒亿元整，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)；一般项目：货物进出口；技术进出口；特种设备销售；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资质情况：持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D350104757，有效期：2023年10月17日，资质类别及等级：石油化工工程施工总承包叁级，城市及道路照明工程专业承包叁级，地基基础专业承包叁级，电子与智能化工程专业承包贰级，特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级。持有《安全生产许可证》，编号：（渝）JZ安许证字〔2004〕000005，许可范围：建筑施工，有效期：2022年9月1日至2025年8月31日。

3.项目监理单位：湖北中科信工程咨询有限公司（以下简称中科信公司），成立日期：2015年12月01日；营业期限：长期，统一社会信用代码：91420111MA4KLGK67W；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：洪山区徐东大道301号团结小区（三期）商住楼1层1号；法定代表人：何木祥；注册资本：叁佰万圆整，经营范围：建筑工程、电力工程设计；工程造价咨询；工程监理；招标代理。（依法须经审理的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质情况：持有《电力工程监理甲级》，证书编号：E142017729-4/4,有效期：2025年9月18日。

4.项目分包单位：湖北同鸿建设工程有限公司（以下简称同鸿公司），成立日期：2018年04月18日；营业期限：长期，统一社会信用代码：91420100MA4KYAGX7P；公司类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：武汉市东西湖区宏图路8号“武汉客厅小型会展中心建设项目”总裁官邸和精英公寓、特色文化街区II、展贸中心第F[幢]/单元9层08号房；法定代表人：汪婷婷；注册资本：贰仟万圆整，经营范围：房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、市政工程、机电工程、消防工程、地基与基础工程、防水工程、保温工程、幕墙工程、钢结构工程、装饰装修工程、公路工程、城市道路照明工程的施工；建筑劳务分包。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

资质情况：持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D342186268，资质类别及等级：输变电工程专业承包叁级、电力工程施工总承包叁级，有效期至：2023年10月10日，法定代表人：陈磊；持有《安全生产许可证》，证书编号：（鄂）JZ安许证字〔2022〕005644，许可范围：建筑施工，有效期：2022年09月23日至2025年09月23日，法定代表人：汪婷婷。

5.项目管桩供货单位：湖北宇鼎管桩有限公司（以下简称宇鼎公司），成立日期：2020年12月21日；营业期限：长期，统一社会信用代码：91420583MA49MR137G；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：湖北省宜昌市枝江市七星台镇工业园区；法定代表人：阮修华；注册资本：叁仟万圆整，经营

范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售，建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件制造；建筑材料销售；模具制造；模具销售；机械设备租赁；装卸搬运；运输设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6.管桩装卸单位：仙桃市魏志刚机械租赁有限公司（以下简称魏志刚机械公司）。成立日期：2021年04月08日；营业期限：长期，统一社会信用代码：91429004MA49QCJH71；公司类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：仙桃市干河办事处黄金大道西端（富迪物流产业园）；法定代表人：魏志刚；注册资本：壹佰万圆整，经营范围许可项目:道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）;一般项目：机械设备租赁；运输设备租赁服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7.魏[redacted]，男，汉族，出生日期：[redacted]，住址：

湖北省仙桃市[redacted]，身份证号：[redacted]6，魏志刚机械公司法定代表人。

8.[redacted]，男，汉族，出生日期：[redacted]，住址：湖北省荆州市[redacted]，身份证号：[redacted]，魏志刚机械公司吊车司机，持有汽车式起重机岗位操作证，证件有效期至2027年10月8日。

9.阮[redacted]男，汉族，出生日期：[redacted]日，住址：湖北省[redacted]身份证号：[redacted]，宇鼎公司法定代表人。

10.[redacted]，男，汉族，出生日期：1970年9月11日，住址：[redacted]，身份证号：[redacted]，宇鼎公司派驻装卸现场负责人。

（二）工程合同签署情况

2022年8月2日，建设单位与重庆电建签订《施工合同》，双方约定由重庆电建承包仙桃陈场渔光互补光伏电站一期100MW项目光伏场区主体（含集电线路）施工，工程地点：湖北省仙桃市陈场镇；签约合同价总价人民币7775.41万元。

2022年9月22日，重庆电建与同鸿公司签订《工程分包合同》，双方约定由同鸿公司承担仙桃陈场渔光互补光伏电站一期100MW项目光伏场区土建和安装劳务分包及部分管柱材料采购，包括但不限于发电场临时设施、光伏支架及基础、光伏组件安装、箱式变压器基础、厂区道路等劳务分包。分包人承包费用人民币

4587.15万元。

2022年11月21日，同鸿公司与宇鼎公司签订《产品买卖合同》。双方约定宇鼎公司向同鸿公司提供型号PHC300-70AB的宇鼎管桩5万米，单价85元每米，总金额425万元（按实际供货量结算），宇鼎公司承担管桩运输至提前设置的临时堆场及卸货工作，到达宇鼎公司现场设置的临时堆场卸货应通知同鸿公司并接受同鸿公司的管理。

2022年11月25日，宇鼎公司与魏志刚机械公司签订《吊装协议》。由魏志刚机械公司承包宇鼎管桩货物卸货工作　承包价根据实际工程量按4元/米管桩结算，含卸货设备油费、工人工资及卸货设备费用。

（三）天气情况

事故当日仙桃天气晴到多云，没有降水，陈场镇气温11.7℃至3.7℃度，北风2.3m/s，天气良好。

二、事故发生经过、报告和救援情况


（一）事故发生经过

2023年1月3日，宇鼎管桩公司未通知同鸿公司当日计划运输及装卸管桩，临时聘请车牌号为鄂ATS011的货车运送管桩至陈场镇徐梁岭村，上午8点左右，魏志刚机械公司临时雇佣的梁治云、唐良兵（死者）、余功清三名工人到达宇鼎管桩租赁的临时管桩堆场，10时左右三人开始卸桩作业，唐良兵和余功清两人在货车货箱上负责吊物绑扎与挂钩作业（唐良兵作业点位于

货箱内靠近车头部、余功清作业点位于货箱内车尾部），梁治云在地面负责摘钩作业，宇鼎管桩现场负责人陈俊在地面协助摘钩；10 时 30 分左右，在卸载至货箱下层管桩时，吊车司机刘杰视线被货车墙板阻挡，在未确认吊点与被吊管桩中心是否处于同一垂线、未调整吊点、看不见管桩的情况下进行起吊作业，因管桩中心点发生偏离，起吊时管桩不平衡，管桩两端未被同时吊起，一端被吊起后，另一端顶在车厢前部平底突起部分，管桩呈倾斜状态，刘杰此时仍然进行起吊操作，顶在车厢的一端管桩被吊起后因应力发生摆动与唐良兵身体碰撞，致唐良兵受伤，送医院抢救无效死亡。



图 1

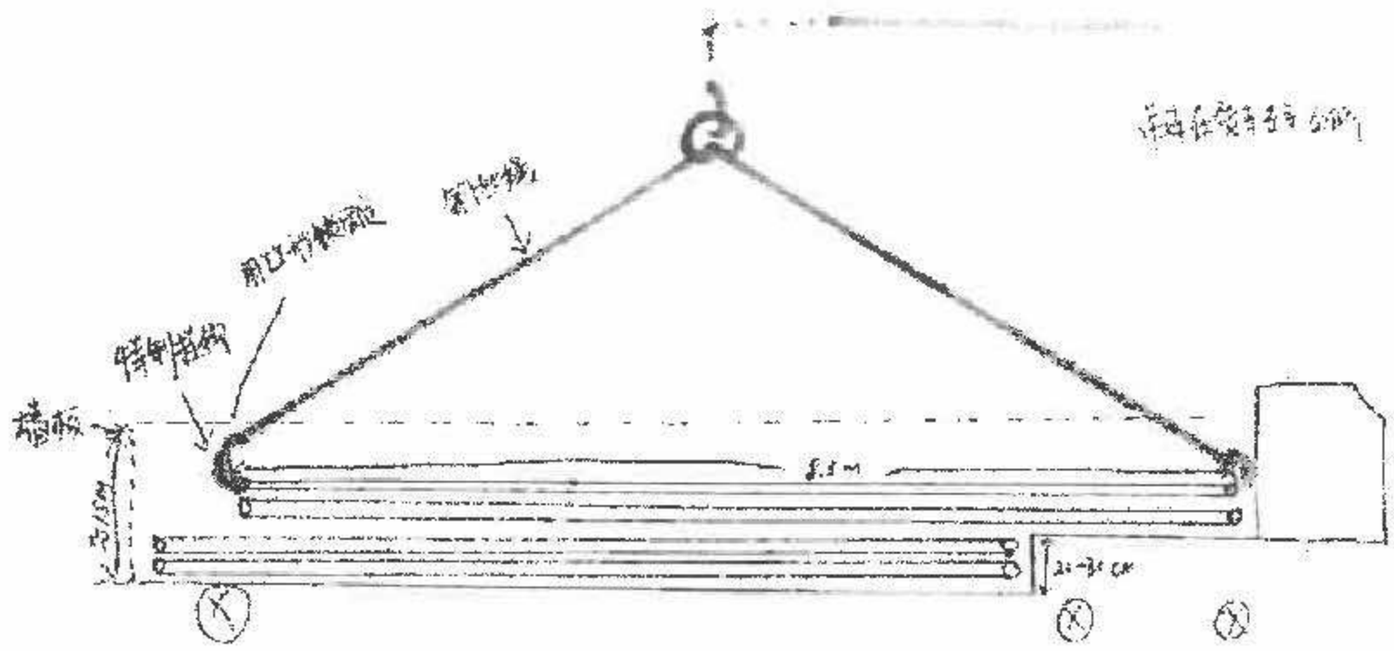

横担两侧用角钢与线路稳定一路。

制表：2023.1.12.

图 2



图 3



图　4

（二）事故上报情况

事故发生后，梁治云立即向陈场镇徐梁岭村村书记梁开军电话进行报告。梁开军立即将事故电话上报陈场镇人民政府，陈场镇人民政府将事故情况上报至仙桃市应急管理局。

（三）事故救援及处置情况

唐良兵受伤后，宇鼎公司现场负责人陈俊立即拨打120急救电话。10点50分左右救护车到达现场，唐良兵被送至陈场镇卫生院，后转至仙桃市第一人民医院救治。14时30分左右，唐良兵抢救无效死亡。

（四）善后工作

事故发生后陈场镇政府维稳办立即介入，组织镇司法所、镇

协调专班、死者家属代表共同处理此事，事发当晚魏志刚机械公司与死者家属达成赔偿意见并签订赔款协议书，未造成负面社会影响。

三、人员伤亡和直接经济损失

死者[redacted]男，身份证号码：[redacted]现年58岁，住址：湖北省仙桃市[redacted]，事故造成直接经济损失105万余元。

四、事故原因

（一）直接原因

吊车司机刘杰在起重作业过程中发现视线受阻且无地面操作人员指挥的情况下进行起重作业，且被吊管桩起吊中心点发生变化未及时调整起吊中心点，未按照《起重机械安全规程-GB6067》17.2.1的规定确认起吊载荷质心[①]，导致起吊不平衡，被吊管桩倾斜摆动与唐良兵发生碰撞，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.湖北宇鼎管桩有限公司，安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产责任制和现场安全管理制度，未对起重作业实施安全管理，未按照规定设置安全管理机构或配备具备相应资格的安全管理人员。

2.仙桃市魏志刚机械租赁有限公司，安全生产主体责任不落实，进行起重危险作业，未建立起重机安全工作制度，未安排专门人员进行现场安全管理和吊装作业指挥，使用未取得司索资格

的人员从事挂钩、摘钩作业。

五、辖区政府及部门履职情况

（一）陈场镇人民政府成立了以党委书记为领导，党委副书记、镇长担任镇安委会主任的安全生产委员会，明确了主要负责人为本辖区内安全生产第一责任人，班子其他成员对分管范围内的安全生产工作领导责任，成立了工作专班，但对辖区生产经营单位安全生产检查督导不力。

（二）仙桃市能源局安全生产职责分工明确，安全生产工作有部署、有计划、有方案、有记录。仙桃陈场渔光互补光伏电站一期100MW项目开工后，仙桃市能源局对该项目开展了3次安全生产检查，下达整改通知书和检查抽查记录3份，但对本行业、领域的安全生产工作监督力度不够。

六、事故性质

事故调查组认定，仙桃陈场渔光互补光伏电站一期100MW项目一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

七、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）有关责任单位

---

①：《起重机械安全规程-GB6067》17.2.1：载荷在吊运前应通过各种方式确认起吊载荷的质量。同时，为了保证起吊的稳定性，应通过各种方式确认起吊载荷质心，确立质心后，应调整起升装置，选择合适的起升系挂位置，保证载荷起升时均匀平衡，没有倾覆的趋势。

1. 湖北宇鼎管桩有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产责任制和现场安全管理制度。对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

2. 仙桃市魏志刚机械租赁有限公司，安全生产主体责任不落实，进行吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理，使用未取得司索资格的人员从事挂钩、摘钩作业。对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）有关责任人员

1. [redacted]杰，魏志刚租赁机械公司吊车司机，在吊桩过程中发现起吊视线受阻且无地面操作人员指挥继续盲目起吊，导致起吊不匀、管桩倾斜摆动，未在吊运前确认起吊载荷的质量，保证起吊的稳定性，未确认起吊载荷质心，导致载荷起升时均匀不平衡，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

2. [redacted]，魏志刚机械租赁公司法定代表人，未履行企业主要负责人安全生产职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故发生负有领导责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

3. [redacted]，宇鼎公司法定代表人，未全面履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未实施本单位安全生产操作规程，未落实隐患排查治理工作，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

4. [redacted]，宇鼎公司派驻装卸现场负责人，未全面履行生产经营单位管理人员安全生产职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除安全隐患，对事故发生负有领导责任，建议由仙桃市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）有关地方政府和行业监管部门

责成仙桃市能源局、陈场镇人民政府向市政府作出书面检查，报市安委会办公室备案。

八、事故防范和整改措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任。相关单位要深刻吸取事故教训，认真学习贯彻相关法律、法规、标准，严格落实各项规章制度和操作规程，加强作业现场安全管理，严格审查作业人员相关资格证件，严格督促从业人员遵章作业，加强现场施工安全管理，加大安全检查力度，及时消除作业现场存在的各类事故隐患，确保施工安全。

（二）加强施工现场隐患排查治理。相关单位要高度重视起重作业风险，制定作业方案、开展起重作业前安全检查，从责任划分、资格审查、安全交底、装备配备、安全措施、现场管理、

应急演练等方面抓好细化，做到责任到人，防范类似事故的发生。

（三）加强属地安全监管。地方政府要加强属地安全监管，全面落实“党政同责、一岗双责”安全监管责任，提升安全监管人员能力，提高安全监管的深度和广度，盯紧高风险重点领域的检查巡查，督促企业落实安全生产主体责任，遏制生产安全事故发生。

仙桃陈场渔光互补光伏电站一期100MW项目“1·3”

一般起重伤害事故调查组

2023年5月30日
